

6615 2121 46

п.п. 201-20167

АКТ № 1

«31» марта 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02651 договору № 1-163 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
1	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	20,00	1 121 220,34			
Выполнено по настоящему Акту:						
1/1	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	10,00	560 610,17	1.1	10.00	560 610,17

Итого к оплате: 560 610 руб. 17 коп. (пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС.


Всего к оплате: 661 520 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 коп.) с НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»

М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.М. Кудряшов

А К Т № 2

«31» марта 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02651 договору № 1-163 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
1	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	20,00	1 121 220,34			
Выполнено по настоящему Акту:						
1/2	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	10,00	560 610,17	1	20,00	1 121 220,34

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6907 от 17.10.2016 г.): 560 610 руб. 17 коп. (пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 100 909,83 руб. Итого 661 520 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»


М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»

В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

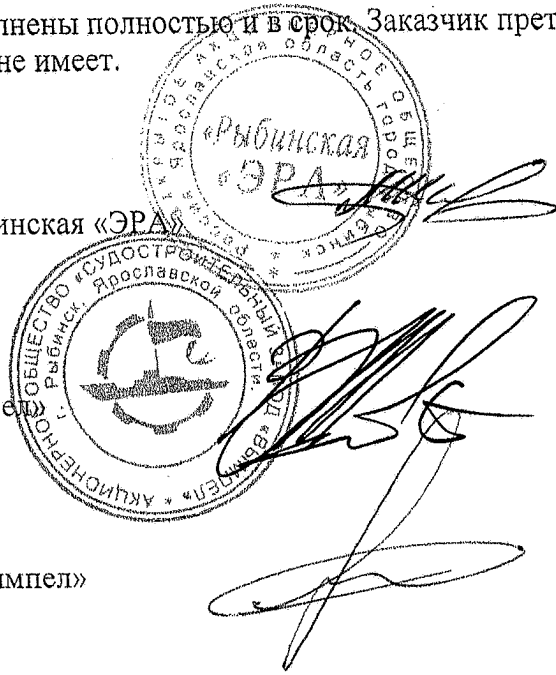

А К Т № 3

«31» мая 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта **12150** заводской № **02651** договору № 1-163 от 28.04.2016 года между **ЗАО «Рыбинская «ЭРА»** и **АО «ССЗ «Вымпел»**.
 Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне	31,00	1 737 881,36	1	20,00	1 121 220,34
Выполнено по настоящему Акту:						
2/1	Монтаж кабеля на судне	5,00	280 305,00	1-2/1	25,00	1 401 525,34

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6907 от 17.10.2016 г.): 280 305 руб. 00 коп. (двести восемьдесят тысяч триста пять рублей 00 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 50 454,90 руб. Итого 330 759 руб. 90 коп. (триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 90 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

А К Т № 4

«31» мая 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта **12150** заводской № **02651** договору № 1-163 от 28.04.2016 года между **ЗАО «Рыбинская «ЭРА»** и **АО «ССЗ «Вымпел»**.

Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне	31,00	1 737 881,36	1-2/1	25,00	1 401 525,34
Выполнено по настоящему Акту:						
2/2	Монтаж кабеля на судне	5,00	280 305,00	1-2/2	25,00	1 681 830,34

Итого к оплате: 280 305 руб. 00 коп. (двести восемьдесят тысяч триста пять рублей 00 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 330 759 руб. 90 коп. (триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 90 коп.) с НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

А К Т № 5

«30» июня 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02651 договору № 1-163 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне	31,00	1 737 881,36	1-2/2	30,00	1 681 830,34
3	Внутренний монтаж электрооборудования	25,00	1 401 525,42			
4	Закрытие построечных документов	5,00	280 254,24			
Выполнено по настоящему Акту:						
2/3	Монтаж кабеля на судне	21,00	1 177 271,36	1-4/1	80,00	4 459 259,48
3	Внутренний монтаж электрооборудования	25,00	1 401 525,42			
4/1	Закрытие построечных документов	4,00	198 632,36			
	Итого:	50,00	2 777 429,14			

Итого к оплате: 2 777 429 руб. 14 коп. (два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч четыреста двадцать девять рублей 14 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 3 277 366 руб. 38 коп. (три миллиона двести семьдесят семь тысяч триста шестьдесят шесть рублей 38 коп.) с НДС.


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

К.Г. Тройник

А К Т № 6

«30» июня 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02651 договору № 1-163 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 26 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
4	Закрытие построечных документов	5,00	280 254,24	1-4/1	80,00	4 459 259,48
5	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	19,00	1 065 230,90			
Выполнено по настоящему Акту:						
4	Закрытие построечных документов	1,00	81 621,88			
5	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	19,00	1 065 230,90			
	Итого:	20,00	1 146 852,78	1-5	100,00	5 606 112,26

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6907 от 17.10.2016 г.): 1 146 852 руб. 78 коп. (один миллион сто сорок шесть тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 78 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 206 433,50 руб. Итого 1 353 286 руб. 28 коп. (один миллион триста пятьдесят три тысячи двести восемьдесят шесть рублей 28 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»

М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»

В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

К.Г. Тройник



17.10.2016
Поступ. в банк плат.

17.10.2016 12:03:08
Списано со сч. плат.

ОДР

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6907

17.10.2016
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Два миллиона триста сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 18 копеек

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	2345566-18		
Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"		Сч. N	40702810800020105483		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА		Сч. N	30101810400000000225		
Банк плательщика		БИК	047888755		
ФИЛИАЛ АКБ "ЛЕГИОН" (АО) В Г.ЯРОСЛАВЛЬ, г.ЯРОСЛАВЛЬ		Сч. N	30101810700000000755		
Банк получателя		Сч. N	40702810800010000422		
ИНН 7610062868	КПП 761001001	Вид. оп.	01	Срок плат.	
ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		Наз. пл.		Очер плат.	5
Получатель		Код		Рез. поле	
Аванс по дог.№1-163 от 28.04.16г за работы по электромонтажу в т.ч. НДС(18%) 357798-23					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

02651

~~_____~~

ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
Корр.счёт 30101810400000000225
ИСПОЛНЕНО
ЭЦП банка верна
17 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

25.09.2017

Поступ. в банк плат.

25.09.2017 15:19:52

Списано со сч. плат.

00P

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8090

25.09.2017

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Три миллиона двести семьдесят семь тысяч триста шестьдесят шесть рублей 38 копеек

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	3277366-38		
Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"			Сч. N	40702810800020105483	
Плательщик ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА		БИК	044525225		
Банк плательщика СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.ЯРОСЛАВЛЬ		Сч. N	30101810400000000225		
Банк получателя ИНН 7610062868		БИК	047888670		
		Сч. N	30101810500000000670		
КПП 761001001		Сч. N	40702810777190101277		
ЗАО "Рыбинская "ЭРА"			Вид. оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер плат.	5
		Код		Рез. поле	
		Оплата по сч 33 от 30.06.17г за выполненные работы В т.ч. НДС(18%) 499937-24			

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

ПАО СБЕРБАНК	
БИК 044525225	
Корр.счѣт 30101810400000000225	
ИСПОЛНЕНО	
ЭЦП банка верна	
25 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.	

21.07.2017

Поступ. в банк плат.

21.07.2017

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5864

21.07.2017

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 90 копеек

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	330759-90	
АО "СЗ "Вымпел"		Сч.№	40706810416250000266	
Платательщик ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ Г. ВОРОНЕЖ		БИК	042007835	
Банк плательщика СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		Сч.№	30101810100000000835	
Банк получателя ИНН 7610062868		БИК	047888670	
КПП 761001001		Сч.№	30101810500000000670	
ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		Сч.№	40702810777190101277	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		
		Код	1418187 4068010 2010500 7373	Рез.поле

Оплата за работы по электромонтажу 275-ФЗ {3 Счет №25 от 31.05.2017} , в т.ч. НДС 18% 50454-90 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.


 БИК 042007835
 ИСПОЛНЕН 21.07.2017

14.06.2017
Поступ. в банк плат.

14.06.2017 9:30:04
Списано со сч. плат.

ООП

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4531

14.06.2017
Дата

электронно
Вид платежа



Сумма
прописью

Шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	661520=	
Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"		Сч. N	40702810800020105483	
Платательщик		БИК	044525225	
ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА		Сч. N	30101810400000000225	
Банк плательщика		БИК	047888670	
СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.ЯРОСЛАВЛЬ		Сч. N	30101810500000000670	
Банк получателя		Сч. N	40702810777190101277	
ИНН 7610062868		КПП 761001001	Вид. оп.	01
ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		Наз. пл.	Срок плат.	5
Получатель		Код	Очер плат.	
			Рез. поле	
Оплата по сч 15 от 31.03.17г за выполненные ЭМ и РСР В т.ч. НДС(18%) 100909-83				

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

02651

ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
Корр.счёт 30101810400000000225
ИСПОЛНЕНО
ЭЦП банка верна
14 ИЮНЯ 2017 Г.
